Amicale des locataires du Clos la Paume



24 mai 2026

10 rue du Clos la Paume
92220 - BAGNEUX

amicalelapaume@gmail.com

Sommaire

1. Nouveaux problèmes p. 3

- Constatation du 21 mai 2026 - Présence de plusieurs dégâts des eaux chez un même locataire p. 3
- Constatation du 21 mai 2026 - Présence d'un autre dégât des eaux chez un même locataire p. 4
- Constatation du 23 mai 2026 - Taille excessive des haies au 1 et 3 rue du Clos la Paume p. 5

2. Anciens problèmes (toujours en cours) p. 6

- Constatation du 26 août 2025 – Evacuation des eaux de pluies arrachée p. 6
- Constatation du 23 janvier 2026 – Boîtes aux lettres dégradées p. 7
- Constatation du 23 janvier 2026 – Jardinières sur les rebords de fenêtres de logement inoccupé p. 8
- Constatation du 23 janvier 2026 – Elagage des arbres p. 9
- Constatation du 23 janvier 2026 – Porte du local des véhicules enfants installée à l'envers p. 10
- Constatation du 23 janvier 2026 – Porte d’entrée d’immeuble mal posée p. 11
- Constatation du 23 janvier 2026 – Porte de placard technique endommagée et toujours ouverte p. 12
- Constatation du 23 janvier 2026 – Béton fissuré sous la coursive p. 13
- Constatation du 23 janvier 2026 – Fenêtre du local retournée vers l’intérieur et bloquée p. 14
- Constatation du 23 janvier 2026 – Ardoises tombées de la toiture p. 15
- Constatation du 23 janvier 2026 - Grilles affaissées et trou très profond p. 16
- Constatation du 23 janvier 2026 – Porte d’accès à la coursive ne se ferme plus p. 17

3. Problèmes réglés p. 18

- Constatation du 16 janvier 2026 – Armoire fibre du parking endommagée
- Constatation du 23 janvier 2026 – Détritus et bonbonnes de gaz dans le parking
- Constatation du 23 janvier 2026 – Haies non taillées
- Constatation du 23 janvier 2026 – les grooms des porte d’accès aux coursives sont détériorés/défectueux
- Constatation du 04 mai 2026 - Cache prise absent dans la cage d'escalier

1. Nouveaux problèmes

Constatation du 21 mai 2026 - Présence de plusieurs dégâts des eaux chez un même locataire

Description factuelle

Deux dégâts des eaux persistants ont été constatés dans l'appartement n°22, 2 rue du Clos la Paume, affectant le séjour et la salle de bain. Malgré la déclaration des sinistres aux assureurs respectifs (locataire et bailleur) et la demande d'intervention d'un professionnel pour identifier la source des fuites, aucune action corrective n'a été engagée à ce jour. Les traces d'humidité et les dégradations des revêtements muraux (écaillage, moisissures) s'aggravent, comme en témoignent les photos jointes. Le locataire a multiplié les relances sans obtenir de réponse du bailleur, bloquant ainsi le processus d'indemnisation.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 1 500–3 000 € (réfection des cloisons, traitement antifongique, remplacement des matériaux dégradés, recherche et colmatage des fuites).
• **Report de ~6 mois** : 3 500–6 000 €. L'inaction prolongée risque d'étendre les dégâts (structurels, moisissures profondes, détérioration des équipements électriques ou sanitaires adjacents), nécessitant des travaux plus lourds et une intervention en urgence coûteuse.

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Élevé**. Prolongation de l'exposition aux moisissures (risque accru d'irritations respiratoires ou allergiques pour les occupants, notamment enfants et personnes sensibles).
• **Assurances** : Le blocage des indemnisations expose le locataire à des préjudices non couverts (dégâts matériels non réparés) et complique la répartition des responsabilités entre les parties. Les assureurs pourraient refuser toute prise en charge en l'absence de preuve de réparation des causes initiales.







Constatation du 21 mai 2026 - Présence d'un autre dégât des eaux chez un même locataire

Description factuelle

Dans l’appartement n°22 (2 rue du Clos la Paume), des cloques, fissures et moisissures sont apparues au plafond de la chambre du locataire, quelques mois après les travaux de réfection des terrasses. Ces dégradations, visibles sur les photos jointes, suggèrent un défaut d’étanchéité ou une infiltration d’humidité liée aux travaux récents. Le bailleur a été informé de la situation, mais aucune action corrective n’a encore été engagée.

Estimation des coûts

• **Réparation rapide** : 1 200–2 500 € (démontage partiel du plafond, traitement antifongique, réfection des enduits et peinture, vérification de l’étanchéité).

• **Report ~6 mois** : 2 500–4 500 € (risque d’aggravation des moisissures, extension des dégâts à d’autres parties du plafond ou des murs adjacents, travaux supplémentaires pour isoler la source d’humidité).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Modéré** – Exposition prolongée aux moisissures pouvant entraîner des irritations respiratoires ou allergiques pour le locataire, notamment en cas de sensibilité accrue.

• **Assurances** : La persistance des dégradations pourrait compliquer la déclaration de responsabilité entre le bailleur et l’entreprise ayant réalisé les travaux, avec un risque d’exclusion ou de réduction de garantie en cas de litige ultérieur.





Constatation du 23 mai 2026 - Taille excessive des haies au 1 et 3 rue du Clos la Paume

Description factuelle

La taille récente des haies aux 1 et 3 rue du Clos la Paume a été jugée excessive, compromettant la sécurité des occupants. Plusieurs sections, notamment à l'angle avec l'avenue Albert Petit, présentent une hauteur insuffisante permettant un accès facile au jardin voisin par simple enjambée. Par ailleurs, une partie de la haie a été taillée en biseau, dépassant sur le trottoir et constituant un risque pour les piétons. Une solution temporaire immédiate, telle que l'installation de poteaux avec brise-vue, est recommandée pour garantir la sécurité des résidents.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 800–1 500 € (pose de brise-vue provisoires et ajustement partiel des haies).

• **Report ~6 mois** : 2 000–4 000 € (risque d'aggravation des dégâts végétaux, extension des zones non sécurisées, et travaux supplémentaires en urgence si incidents survenant en l'absence de protection).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Élevé** – Risque accru de chutes ou de blessures pour les piétons (contact avec les branches basses ou les haies mal taillées) et d'intrusions dans les jardins privés.

• **Assurances** : En cas d'accident lié à ces désordres, la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, compliquant les démarches de déclaration et augmentant les primes ou exclusions de garantie.







2. Anciens problèmes (toujours en cours)

Constatation du 26 août 2025 – Evacuation des eaux de pluies arrachée

Description factuelle

Lors des travaux d’évacuation des eaux pluviales réalisés au niveau de l’entrée du 2 rue du Clos la Paume, la boîte de raccordement du système a été arrachée du mur, laissant apparaître une zone de fixation endommagée. Cette intervention a perturbé l’étanchéité initiale, avec un risque visible de fissures ou de désalignement autour de la fixation. Les photos confirment l’absence de calage ou de jointoiement étanche, exposant le mur à d’éventuelles infiltrations d’eau en cas de pluie.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 300–600 € (réinstallation de la boîte, rebouchage des trous, application d’un mastic étanche et éventuelle réparation partielle du support).

• **Report d’environ 6 mois** : 800–1 500 €. Un délai prolongé pourrait entraîner une dégradation du mur (humidité, moisissures, fissures étendues) et nécessiter des travaux de ragréage ou de réfection partielle de l’enduit, augmentant significativement la facture.

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Modéré*. Risque d’humidité persistante pouvant favoriser le développement de moisissures dans les locaux adjacents, avec des conséquences sanitaires potentielles (irritations, allergies) pour les occupants ou utilisateurs fréquents de l’entrée.

• **Assurances** : En cas de dégradation ultérieure (infiltrations, dégâts des eaux), la responsabilité du bailleur pourrait être engagée si la non-réparation est jugée négligente, compliquant les démarches de déclaration auprès de l’assurance de l'immeuble ou des assurances individuelles des locataires.





Constatation du 23 janvier 2026 – Boîtes aux lettres dégradées

Description factuelle

Les boîtes aux lettres installées au 2 rue du Clos la Paume présentent une dégradation sur la charnière gauche du panneau principal. Cette avarie empêche une fermeture complète du panneau et perturbe l'ouverture des cases individuelles, compromettant ainsi la distribution sécurisée du courrier. Les photos confirment un endommagement mécanique localisé, nécessitant une intervention pour rétablir le fonctionnement normal.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 300–600 € (remplacement de la charnière et ajustement éventuel du panneau).

• **Report ~6 mois** : 500–900 € (risque de de torsions des charnières restantes, usure des mécanismes de verrouillage, ou dégradation étendue nécessitant un remplacement partiel ou total du panneau).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Modéré* – Exposition à des tentatives d'intrusion ou de vol de courrier pour les résidents, avec un risque accru de nuisances ou de perte de documents sensibles.

• **Assurances** : En cas de vol ou de perte de courrier (ex. documents administratifs, colis), la responsabilité du bailleur pourrait être engagée si la dégradation n'est pas réparée, compliquant les démarches d'indemnisation auprès des assurances des propriétaires.





Constatation du 23 janvier 2026 – Jardinières sur les rebords de fenêtres de logement inoccupé

Description factuelle

Les logements vacants situés aux adresses 2 et 4 rue du Clos la Paume présentent des jardinières installées sur les rebords de terrasse, en violation du règlement intérieur de l'immeuble rappelées aux occupants. Ces installations, non conformes aux consignes de sécurité et d'entretien, exposent les parties communes à un risque d'aggravation des dégradations (humidité, projections, obstructions). Leur présence en l'absence de locataire, aurait nécessité une intervention prioritaire du bailleur avant toute nouvelle mise en location.

Estimation des coûts

• **Réparation rapide** : 150–400 € (retrait des jardinières, nettoyage des rebords, vérification des fixations et éventuels dégâts résiduels).

• **Report ~6 mois** : 500–1 200 € (risque accru de dégradation des balcons, infiltration d'eau, corrosion des fixations métalliques, et travaux supplémentaires pour restaurer les parties communes).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Elevé* – Exposition des futurs occupants ou des agents d'entretien à des chutes d'objets (jardinières ou terre) ou à des glissades sur des surfaces détériorées par l'humidité.

• **Assurances** : Le bailleur pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de dommages aux parties communes ou aux biens des occupants, compliquant les démarches de déclaration auprès de l'assurance de l'immeuble.





Constatation du 23 janvier 2026 – Elagage des arbres

Description factuelle

Les arbres plantés le long de la rue du Clos-la-Paume présentent une végétation dense et non entretenue depuis plus d'une décennie, avec des branches basses envahissant partiellement l'espace public et les trottoirs. Cette situation, visible sur les photos jointes, affecte l'esthétique du quartier et pourrait, à terme, générer des risques pour la sécurité des usagers (piétons, véhicules) en cas de chute de branches ou de développement anarchique des racines. Bien que la responsabilité de l'élagage incombe à la Ville de Bagneux, le bailleur est invité à relancer les services municipaux pour une intervention prioritaire.

Estimation des coûts

• **Réparation rapide (élagage partiel ou complet des arbres concernés)** : 3 000–7 000 € (ordre de grandeur, selon l'état sanitaire des arbres et la complexité des travaux).

• **Report de ~6 mois** : 5 000–12 000 €. Un délai prolongé pourrait entraîner une dégradation accrue des arbres (risque de mortalité végétale, développement de champignons ou parasites), nécessitant des interventions plus coûteuses ou des abattages partiels.

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Modéré*. Exposition accrue aux chutes de branches (risque de blessures pour les piétons circulants à proximité des arbres).

• **Véhicules** : *Modéré*. Risque de dommages aux véhicules stationnés ou en circulation (branches cassées, racines soulevant les revêtements, visibilité réduite).

• **Assurances** : En l'absence d'intervention, le bailleur pourrait être tenue pour responsable en cas de sinistre lié à l'état des arbres (ex. : chute de branche endommageant un véhicule ou blessant un tiers), compliquant les démarches de déclaration auprès des assurances.





Constatation du 23 janvier 2026 – Porte du local des véhicules enfants installée à l'envers

Description factuelle

La porte d’accès au local situé au 2 rue du Clos la Paume présente un ouvrant vers l’intérieur, bloquant son utilisation normale en cas d’encombrement (ici, par des vélos stationnés). Cette configuration empêche une ouverture complète et sécurisée, nécessitant un dégagement manuel des obstacles pour accéder au local. Une modification de l’ouverture vers l’extérieur est recommandée pour des raisons de sécurité et de praticité.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)


• **Réparation rapide** : 300–600 € (démontage, modification des gonds et réinstallation de la porte).

• **Report ~6 mois** : 500–900 € (risque d’aggravation des gonds ou de la porte par des tentatives d’ouverture forcée, ainsi que des coûts supplémentaires liés à des travaux en urgence si blocage récurrent).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Modéré** – Risque de blessures légères (écorchures, chocs) pour les occupants tentant de forcer l’ouverture ou se déplaçant dans l’espace restreint.

• **Assurances** : En cas de sinistre lié à un blocage prolongé (ex. impossibilité d’évacuation en cas d’urgence), la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, avec un impact sur la garantie responsabilité civile.

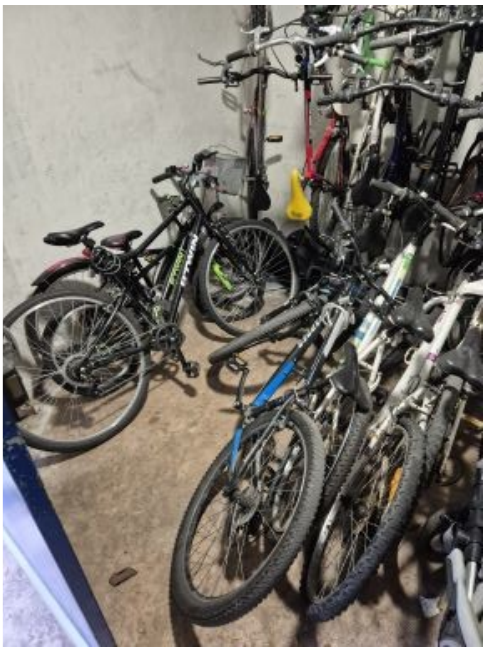



Constatation du 23 janvier 2026 – Porte d’entrée d’immeuble mal posée

Description factuelle

La porte d’entrée du 2 rue du Clos la Paume, récemment équipée d’un nouveau groom, heurte violemment le mur lors de son ouverture, provoquant des fissures et des éclats sur la base en béton ainsi que des dommages sur le chant de la porte. Les images montrent une dégradation localisée du mur (fissuration et érosion du béton) et des traces d’impact sur le sol. Une butée de protection est nécessaire pour éviter l’aggravation des dégâts.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 300–600 € (pose d’une butée adaptée, réparation des fissures du béton et éventuel ajustement de la porte).

• **Report ~6 mois** : 800–1 500 € (risque d’extension des fissures, dégradation accélérée du mur et de la porte, travaux plus complexes en urgence).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Modéré* – Risque de chute ou de blessure pour les usagers (locataires, visiteurs) en cas de fragmentation brutale du béton ou de déséquilibre de la porte.

• **Assurances** : En l’absence d’intervention, les dégâts pourraient être imputés à un défaut d’entretien, compliquant la déclaration auprès de l’assurance du bailleur en cas de sinistre ultérieur.





Constatation du 23 janvier 2026 – Porte de placard technique endommagée et toujours ouverte

Description factuelle

Au 2 rue du Clos la Paume, la porte d'un placard situé dans les escaliers présente une charnière et un loquet de blocage endommagés, empêchant sa fermeture et exposant les gaines techniques (électricité, gaz, câble numérique, fibre optique) à un accès non sécurisé. Un contrôle systématique des autres portes de placards dans les parties communes doit être effectué, plusieurs présentant des dysfonctionnements similaires. L'accès non maîtrisé à ces gaines représente un risque de dégradation des installations.


Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 300–600 € par porte (remplacement des charnières, loquet, serrure adaptée et révision de la fermeture). Pour l'ensemble des portes concernées (estimé à 3–5 unités), prévoir **900–3 000 €**.
• **Report ~6 mois** : 1 500–5 000 €. L'aggravation des dégâts (dégradation des gaines par manipulations, risques électriques/gaz accrus) et la nécessité de travaux en urgence (ex. remplacement de câblage abîmé) majorent significativement les coûts.

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Élevé**. Exposition à des risques d'électrocution (gainage électrique accessible) ou de chute (objets instables dans les gaines) pour les occupants, les techniciens intervenant dans les parties communes, et les enfants. Risque accru en cas de manipulation involontaire des installations.
• **Assurances** : En cas d'accident lié à l'accès non sécurisé (ex. court-circuit, incendie), la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, compliquant les démarches de déclaration auprès des assurances et entraînant des exclusions de garantie pour les dommages aux biens ou aux personnes.



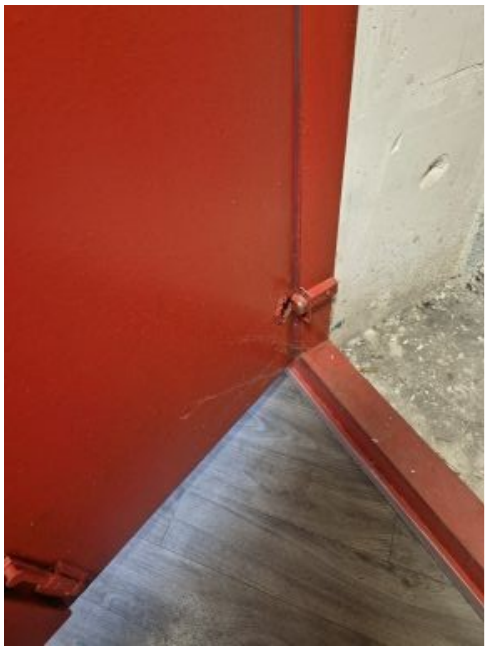

Constatation du 23 janvier 2026 – Béton fissuré sous la coursive

Description factuelle

Une fissure importante dans le dallage en béton de la coursive du 3I étage, située au droit de la porte d'accès du 1I³ étage, a entraîné un effritement localisé. Un morceau de béton, partiellement détaché, menace de se détacher, compromettant la stabilité structurelle de la zone. La fissure, visible depuis le niveau inférieur, s'étend sur une longueur d'environ 30 cm et présente une profondeur notable. Ce désordre affecte directement la sécurité des circulations piétonnes.

Estimation des coûts

• **Réparation rapide** : 1 200–2 500 € (intervention d'un professionnel pour consolidation, réparation et rebouchage du béton, avec éventuel renforcement localisé).

• **Report d'environ 6 mois** : 3 000–6 000 € (risque d'aggravation des fissures, extension des dégâts à d'autres parties du dallage, travaux plus complexes incluant un diagnostic structurel et des renforts supplémentaires).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Critique** – Risque élevé de chute pour les usagers circulant sur les coursives, notamment les enfants et les personnes à mobilité réduite, en raison de la fragilisation du support.

• **Assurances** : En cas d'accident lié à cette dégradation, la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, avec des conséquences sur les garanties dommage-ouvrage ou responsabilité civile. Une déclaration préventive auprès de l'assureur est recommandée pour couvrir les éventuels sinistres.





Constatation du 23 janvier 2026 – Fenêtre du local retournée vers l’intérieur et bloquée

Description factuelle

La fenêtre arrière du local de l’amicale des locataires, situé au 10 rue du Clos la Paume, est retournée vers l’intérieur et bloquée dans cette position depuis plusieurs années. L’ouverture est ainsi inutilisable et expose le local à des risques d’intrusion ou de dégradations supplémentaires. Une intervention est requise pour remettre la fenêtre en position fonctionnelle ou, en attente de réparation, la condamner de manière sécurisée.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 300–600 € (remplacement des axes de fermeture et remise en état du mécanisme).

• **Report ~6 mois** : 500–1 000 € (risque d’aggravation des dégâts sur le cadre, extension des désordres liés à l’exposition aux intempéries, et éventuels travaux complémentaires pour condamnation sécurisée).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Modéré* – Risque d’intrusion ou de chute accidentelle pour les occupants du local en cas de tentative d’utilisation forcée.

• **Assurances** : En cas de vol ou de dégradations consécutives à l’impossibilité de condamner le local, la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, compliquant les démarches de déclaration auprès de l’assurance de l'immeuble.



Constatation du 23 janvier 2026 – Ardoises tombées de la toiture

Description factuelle

Des ardoises manquantes ou fissurées sur la toiture du bâtiment situé au 4 rue du Clos la Paume ont entraîné des infiltrations d'eau, visibles par des traces d'humidité et des ouvertures non protégées. Le risque de chute d'autres ardoises est avéré, compromettant l'étanchéité et la stabilité de la couverture. Ces dégradations affectent potentiellement les parties communes et les lots adjacents. Une intervention urgente est nécessaire pour éviter une dégradation accélérée de la structure.

Estimation des coûts

• **Réparation rapide** : 2 500–5 000 € (démontage partiel, remplacement des ardoises défectueuses, étanchéité, consolidation éventuelle de la charpente).

• **Si report (~6 mois)** : 5 000–10 000 € (risque d'aggravation des infiltrations, pourriture des bois de charpente, extension des dégâts aux plafonds des lots concernés, travaux supplémentaires pour réparer les dégâts collatéraux).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : *Modéré* – Exposition des occupants et passants à des chutes d'ardoises (risque de blessures légères à modérées, notamment en cas de passage sous la toiture ou dans les zones adjacentes).

• **Assurances** : En cas de sinistre lié à ces infiltrations (dégâts des eaux, moisissures), la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, compliquant les démarches de déclaration et de prise en charge par les assurances. Un retard pourrait entraîner un rejet partiel ou total des demandes d'indemnisation.



Constatation du 23 janvier 2026 - Grilles affaissées et trou très profond

Description factuelle

À l’angle des lots 8 et 10 de la rue du Clos la Paume, près de la loge du gardien, les grilles de protection du réseau souterrain (probablement d’assainissement ou d’électricité) sont affaissées, formant un vide d’environ 20 à 30 cm de profondeur. La dalle de béton adjacente présente des fissures et des signes de soulèvement, tandis que des débris végétaux et des feuilles s’accumulent dans l’ouverture. L’accès à cette zone est partiellement obstrué par une dalle de trottoir désalignée.

Estimation des coûts

• **Réparation rapide** : 1 200–2 500 € (démontage sécurisé, réfection des grilles, rebouchage du vide, réparation des fissures de la dalle et réalignement du trottoir).

• **Report d’environ 6 mois** : 2 500–4 000 € (risque d’aggravation des fissures, affaissement supplémentaire des grilles, extension des dégâts à d’autres parties du réseau souterrain ou du trottoir, nécessitant des travaux plus lourds et une intervention en urgence coûteuse).

Risques en cas de non prise en charge

• **Personnes** : **Élevé** – Risque de chute pour les piétons (enfants, personnes âgées ou à mobilité réduite) dans le vide, pouvant entraîner des blessures (entorses, fractures). Exposition accrue en cas de pluie ou de gel, aggravant l’instabilité du sol.

• **Assurances** : En l’absence de réparation, la responsabilité du bailleur pourrait être engagée en cas d’accident (déclaration obligatoire à l’assurance de l'immeuble), avec un risque de refus de prise en charge des dommages corporels ou matériels liés à l’incident. Aggravation possible des garanties en cas de sinistre ultérieur (ex. infiltration d’eau dans les locaux).





Constatation du 23 janvier 2026 – Porte d’accès à la coursive ne se ferme plus

Description factuelle

La porte d’accès à la coursive du premier étage présente un dysfonctionnement structurel : elle ne se ferme plus correctement et est voilée, compromettant son étanchéité et sa fermeture sécurisée. Les charnières et le cadre semblent déformés ou usés, et la peinture est écaillée, indiquant un manque d’entretien prolongé. Cette situation expose les parties communes à des risques d’intrusion et de dégradation accélérée.

Estimation des coûts (ordre de grandeur)

• **Réparation rapide** : 800–1 500 € (remplacement des charnières, ajustement du cadre, ponçage et repeinture).
• **Report ~6 mois** : 1 500–2 500 € (risque d’aggravation des dégâts, nécessitant un remplacement partiel ou total de la porte, ainsi que des travaux complémentaires sur le mur ou le sol adjacent).

Risques en cas de non prise en charge


• **Personnes** : **Modéré** – Exposition à des intrusions ou des accès non autorisés dans les parties communes, pouvant générer des nuisances ou des conflits entre copropriétaires.
• **Assurances** : En cas de vol ou de dégradation consécutive à l’accès facilité par cette porte défectueuse, la responsabilité du bailleur pourrait être engagée, compliquant les démarches de déclaration auprès des assurances.





3. Problèmes réglés

- Constatation du 16 janvier 2026 – Armoire fibre du parking endommagée
- Constatation du 23 janvier 2026 – Détritus et bonbonnes de gaz dans le parking
- Constatation du 23 janvier 2026 – Haies non taillées
- Constatation du 23 janvier 2026 – les grooms des porte d’accès aux coursives sont détériorés/défectueux
- Constatation du 04 mai 2026 - Cache prise absent dans la cage d'escalier

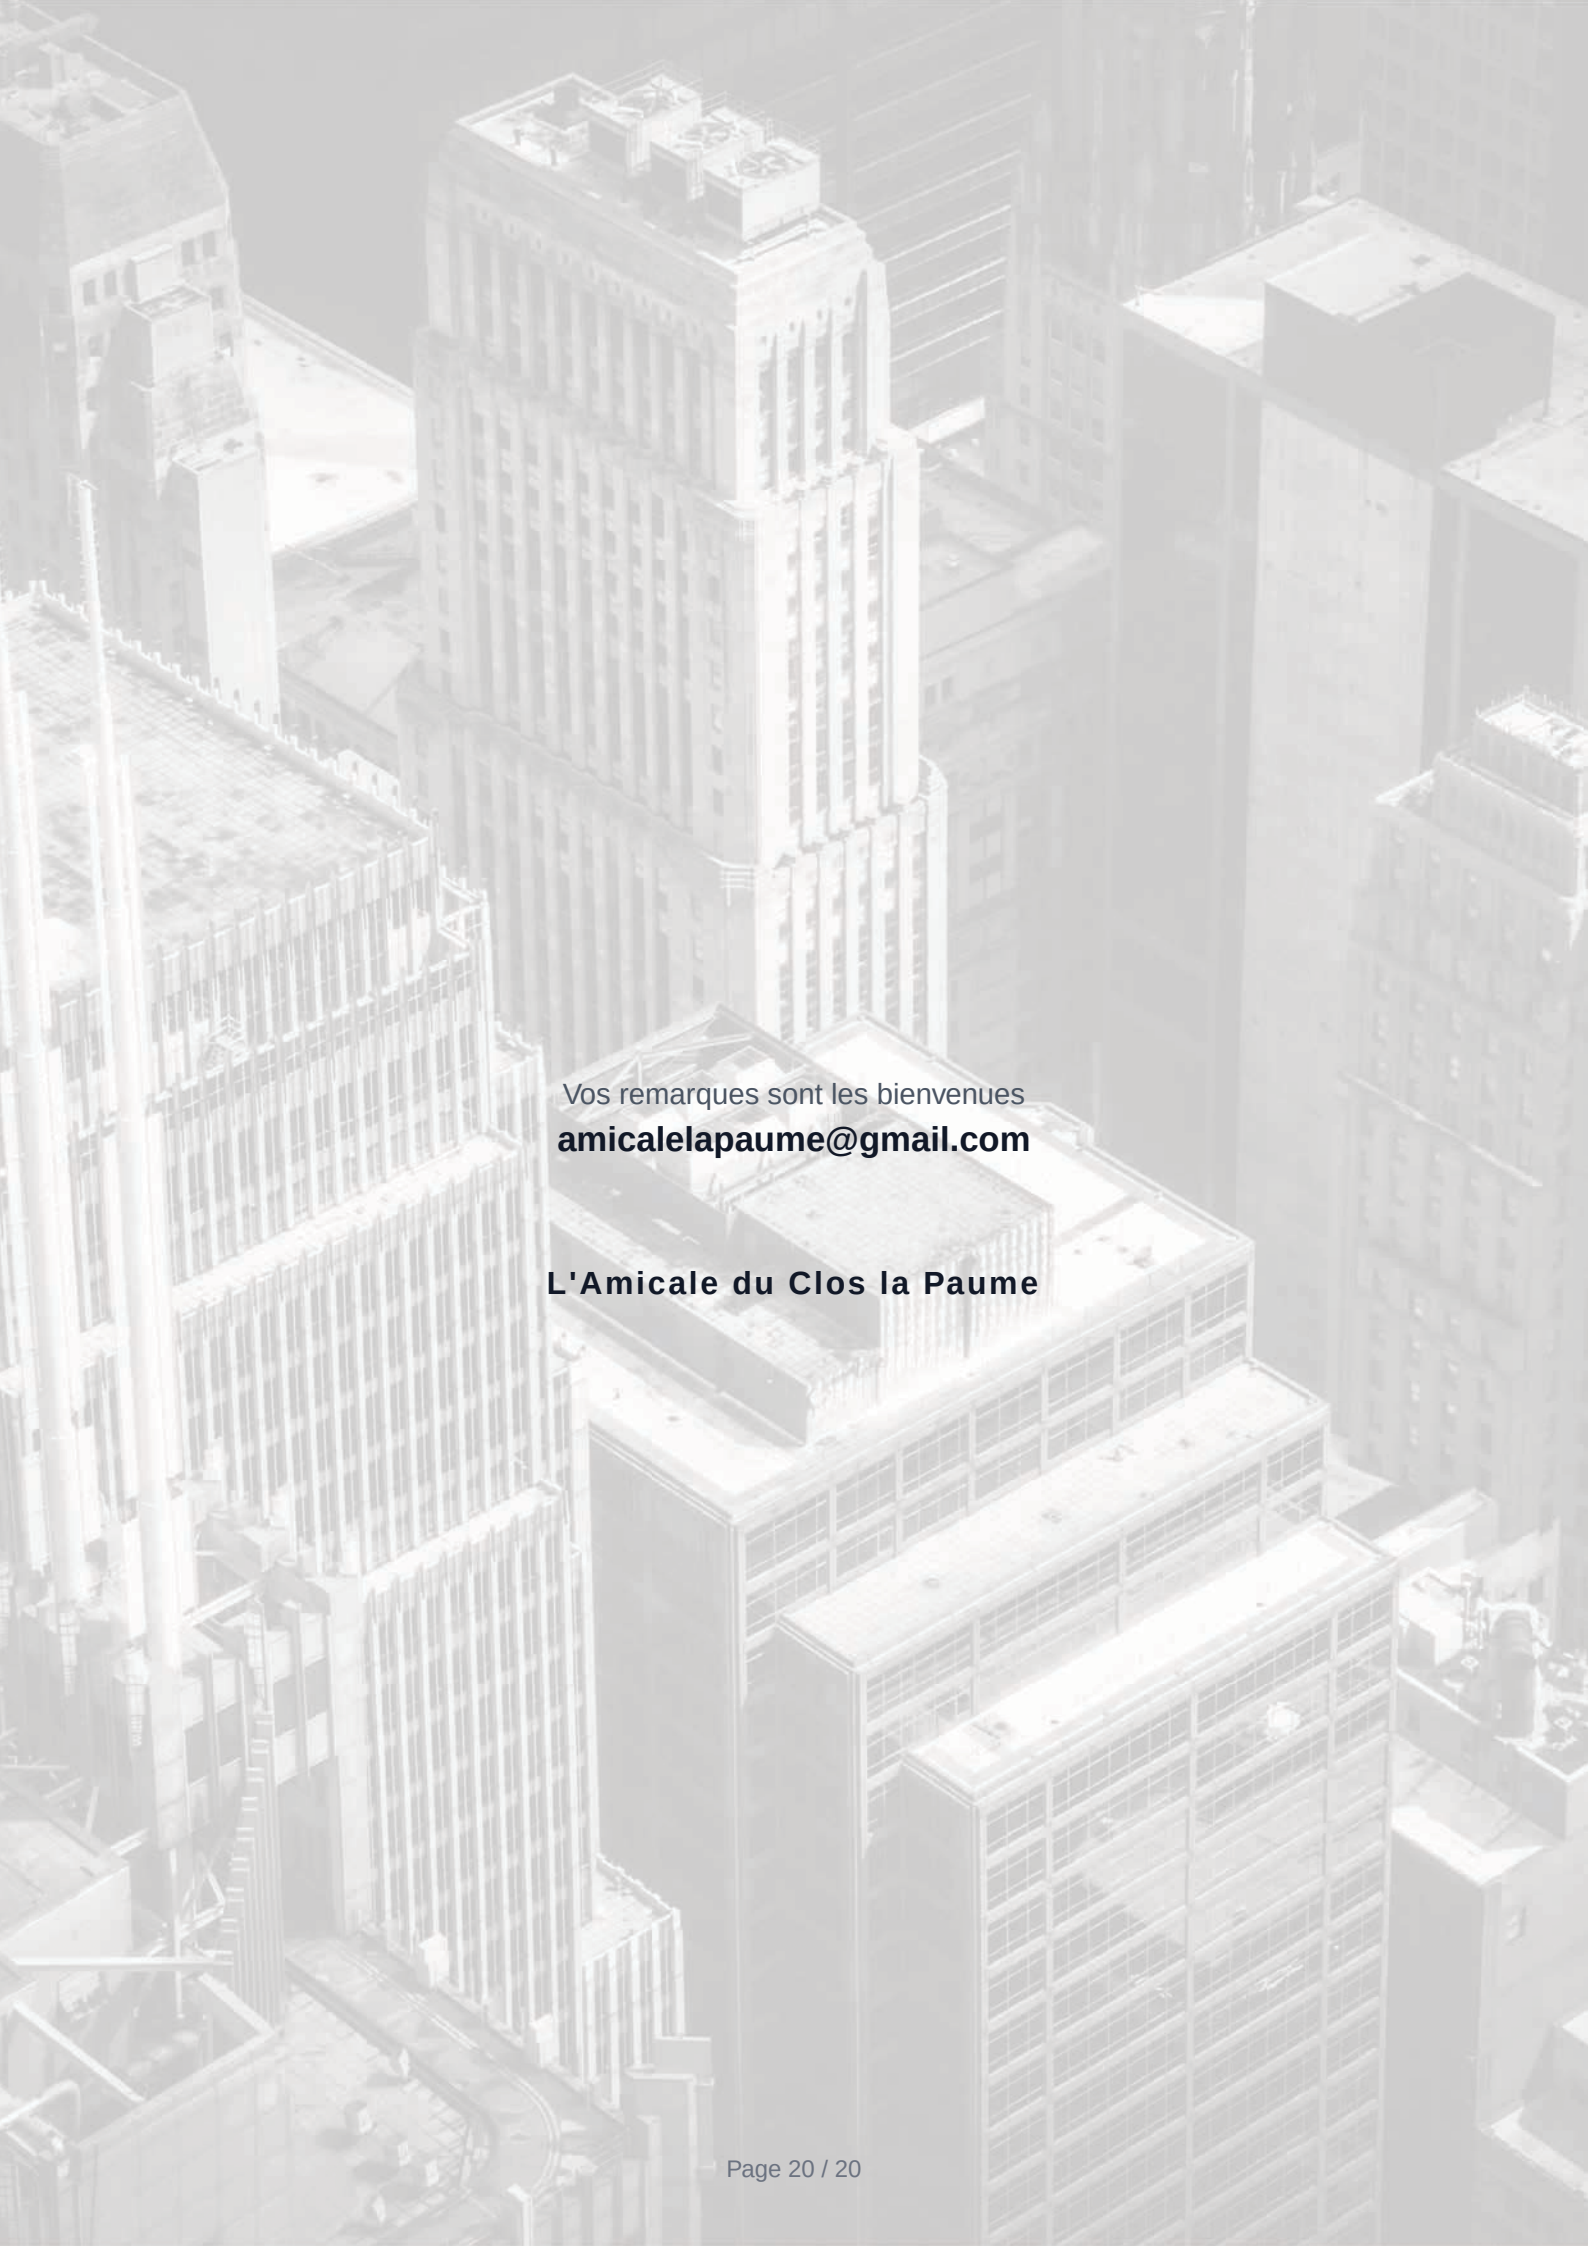

Vos remarques sont les bienvenues

amicalelapaume@gmail.com

L'Amicale du Clos la Paume
